Act ID	Description	Orig Dur	Rem Dur	Early Start	Early Finish
1000	Traffic Control	1	1	05JUL17	05JUL17
1010	Erosion Control	1	1	05JUL17	05JUL17
1020	Mobilization	1	1	05JUL17	05JUL17
1030	Storm sewer RIver to Front St	4	4	05JUL17 *	10JUL17
1035	Storm sewer thru 2nd St.	5	5	11JUL17	17JUL17
1036	2nd St. Surface Replacement	3	3	21JUL17	25JUL17
1040	Storm sewer to 3rd St.	6	6	18JUL17	25JUL17
1050	Storm Sewer thru 4th St.	2	2	26JUL17	27JUL17
1060	4st St. Surface Replacement	5	5	28JUL17	03AUG17
1070	Sanitary Sewer(4th St East)	2	2	28JUL17	31JUL17
1080	Storm Sewer thru 5 St.	6	6	01AUG17	08AUG17
1090	Storm Sewer thru 6th St.	5	5	09AUG17	15AUG17
1100	Watermain thru 6 St.	4	4	01AUG17	04AUG17
1110	Sanitary Sewer thru 6 St.	3	3	07AUG17	09AUG17
1120	Storm Sewer to Cass St.	10	10	16AUG17	29AUG17
1130	Watermain (6 St.)	4	4	16AUG17	21AUG17
1140	Services on Ferry St. (4th-6th St)	1	1	08AUG17	08AUG17
1150	Sanitary Sewer (6 St)	5	5	22AUG17	28AUG17
1160	Services (6 St.)	3	3	29AUG17	31AUG17
1170	Grading Ferry St. (4th-6th)	4	4	09AUG17	14AUG17
1180	Grading (6th)	5	5	29AUG17	04SEP17
1190	Curb & Gutter	5	5	05SEP17	11SEP17
1200	Driveways	4	4	12SEP17	15SEP17
1205	Asphalt Binder	1	1	18SEP17	18SEP17
1210	Restoration	5	5	19SEP17	25SEP17
1220	Asphalt Surface	1	1	26SEP17	26SEP17
1230	Project Clean-up	1	1	27SEP17	27SEP17

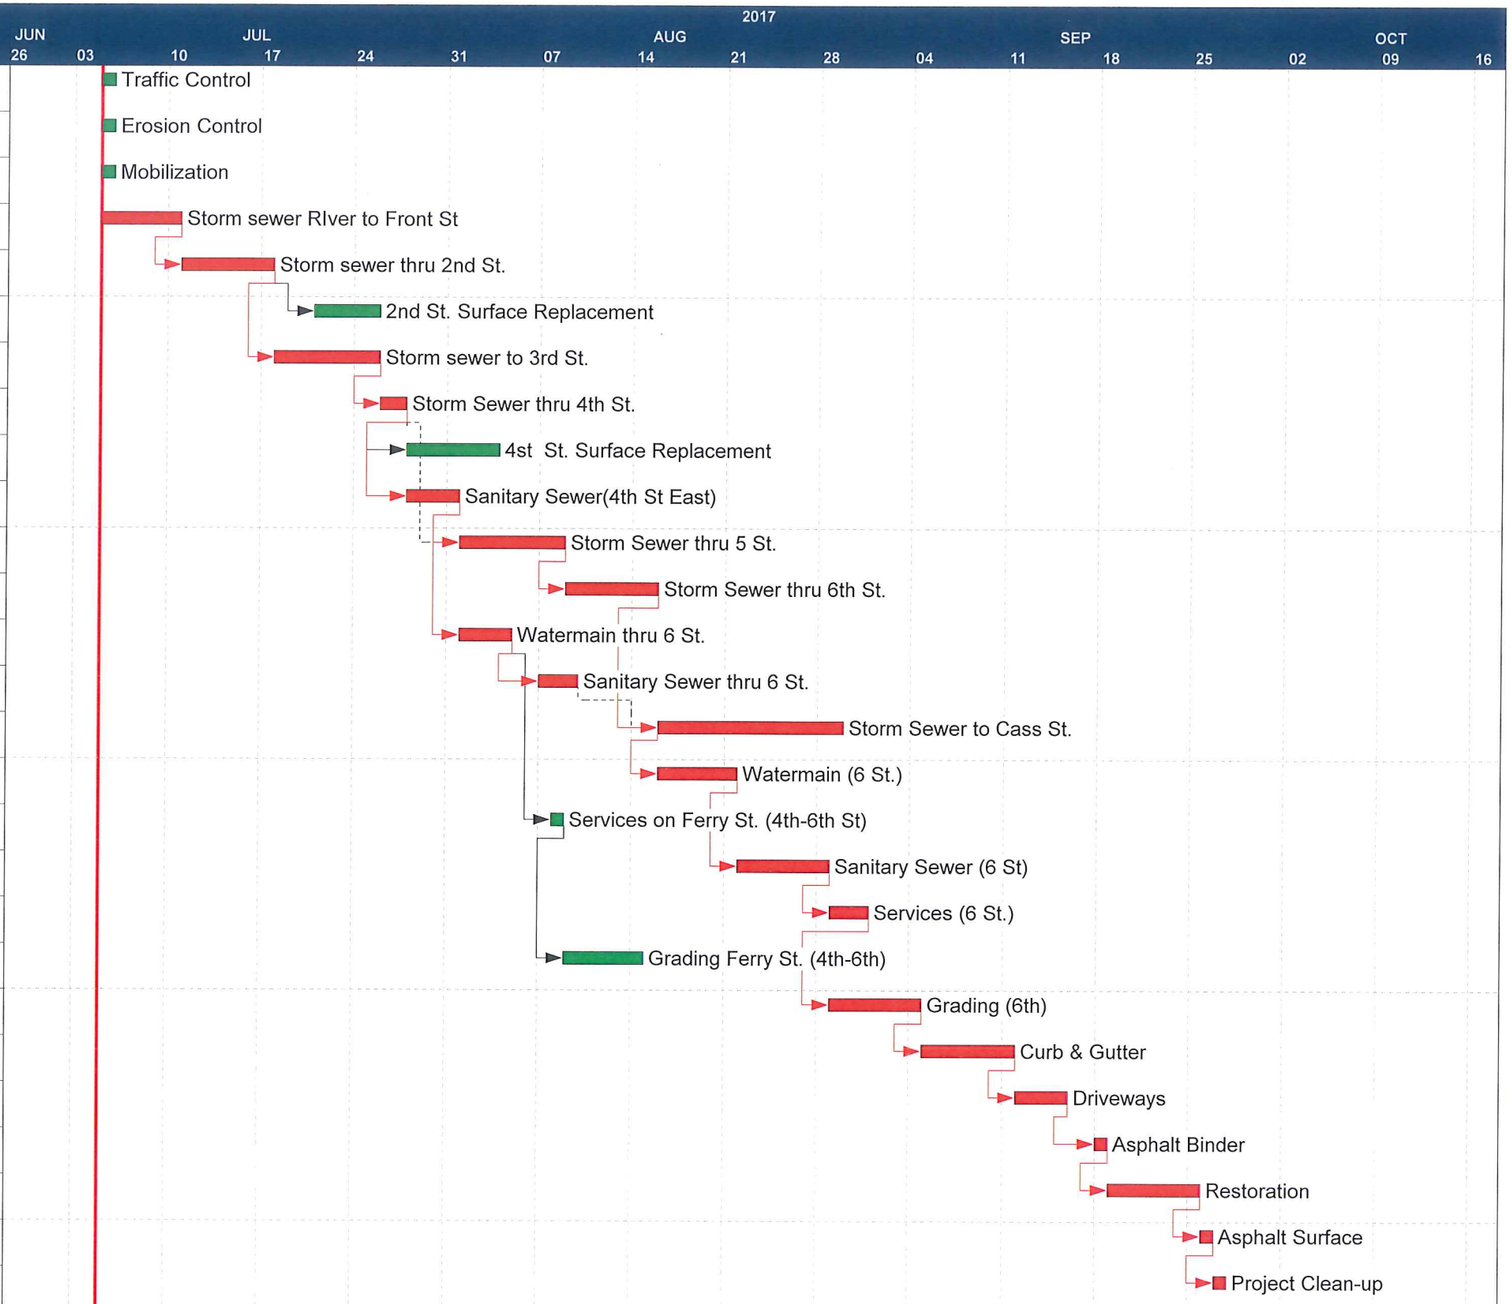

Start date	05JUL17
Finish date	27SEP17
Data date	05JUL17
Run date	26JUN17
Page number	1A

© Primavera Systems, Inc.

A-1 Excavating, Inc.
LaCrosse - Ferry St. Storm Sewer

Early bar
Progress bar
Critical bar
Summary bar
Start milestone point
Finish milestone point
